Mecklenburg Vorpommern
MV tut gut.

Bauherr ist das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch den Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern, Projektgruppe Klinikbau.

Neubau Ver- und Entsorgungszentrum	
Planungsauftrag	03.2008
Grundsteinlegung	01.2011
Baubeginn Rohbau	11.2010
Richtfest	10.2011
Bauende	11.2012
Gesamtbaukosten	17,6 Mio. €
Hauptnutzfläche	3.444 m^2
umbauter Raum	26.300 m^3
verbauter Beton	2.800 Tonnen
verbauter Bewehrungsstahl	650 Tonnen
abgepumptes Wasser	6.000 m^3
Architekt	Haid +Partner Architekten +Ingenieure, Nürnberg

Baufeld VEZ im August 2011

Neubaumaßnahme des BBL M-V, Projektgruppe Klinikbau:

Ver- und Entsorgungszentrum

Universitätsklinikum Rostock, Campus Schillingallee

Richtfest, 13. Oktober 2011, 14 Uhr

weitere Informationen zur Neubaumaßnahme unter:

www.bbl-mv.de

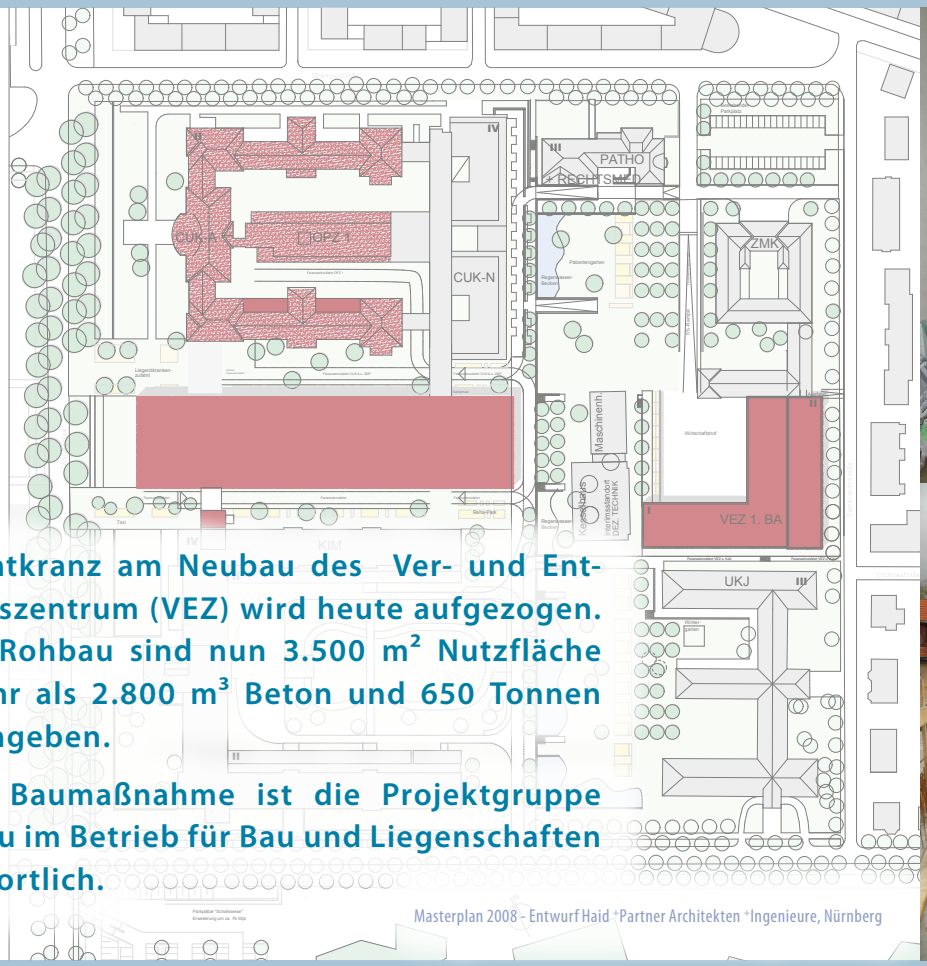

Masterplan 2008 - Entwurf Haid + Partner Architekten + Ingenieure, Nürnberg

Der Richtkranz am Neubau des Ver- und Entsorgungszentrum (VEZ) wird heute aufgezogen. In dem Rohbau sind nun 3.500 m² Nutzfläche von mehr als 2.800 m³ Beton und 650 Tonnen Stahl umgeben.

Für die Baumaßnahme ist die Projektgruppe Klinikbau im Betrieb für Bau und Liegenschaften verantwortlich.

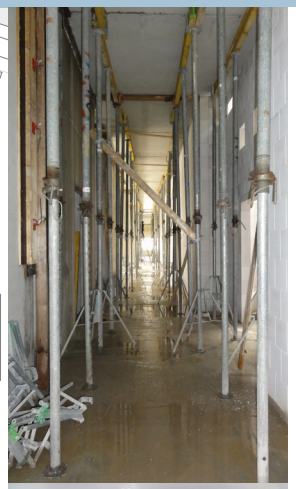

Baustelle am 1.9.2011

Baustelle am 8.12.2010

Auf dem Campus Schillingallee entsteht ein modernes Klinikum - mit 138 Mio. € das finanziell größte Bauprojekt für die Universitäten und Hochschulen unseres Bundeslandes.

Mit dem VEZ bekommt das Universitätsklinikum Rostock bis Ende des kommenden Jahres sein logistisches Zentrum.

Seit Einrichtung der Baustelle im November 2010 gingen uns wegen des harten Winters und verregneten Sommers 44 Arbeitstage verloren. Mehr als 6.000 m³ Regen- und Grundwasser haben wir von der Baustelle gepumpt: das reicht um ein Fußballfeld mannshoch unter Wasser zu setzen.

Durch Überstunden und Samstagsarbeit konnten wir den Verzug ausgleichen, zurück in den Zeitplan kommen und damit den ursprünglichen Termin halten können.

Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern, Projektgruppe Klinikbau | Wallstraße 2 | D-18055 Rostock | fon +49 381 469 87005 | fax +49 381 469 87008 | poststelle@bbl-mv.de | www.bbl-mv.de
